



**Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**  
Bytterecká 2180, 026 80 Dolný Hubín

# ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA 6

**Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy –  
Žaškov, Párnica, Oravská Poruba,  
Veličná**

za obdobie 02/2023 – 04/2023



SLOVENSKÁ AGENTÚRA  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVAK ENVIRONMENT  
AGENCY



MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OPERAČNÝ PROGRAM  
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Európska únia  
Európske štrukturálne  
a investičné fondy

## Projekt:

### „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín. Druh projektu – dopytovo orientovaný.

## Základné údaje:

Kód projektu:

**310011A105**

Kód výzvy:

**OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1**

Prioritná os:

**Udržateľné využívane prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry**

Investičná priorita:

**Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek**

Špecifický cieľ:

**Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ**

Riadiaci orgán:

**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**

Sprostredkovateľský orgán:

**Slovenská agentúra životného prostredia**

Prijímateľ pomoci:

**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Časové väzby:

**Začiatok výstavby: 12/2021**

**Koniec výstavby: 12/2023**

Celkové oprávnené výdavky:

**17 694 957,18 €**

Nenávratný finančný príspevok:

**15 925 461,46 €**

Vlastné zdroje Prijímateľa:

**1 769 495,72 €**

Zhotoviteľ stavby:

**Združenie „ORAVA VSCVH“:**

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

Bratislava

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Banská Štiavnica

VÁHOSTAV – SK, a.s.

Bratislava

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

Bratislava

Stavebný dozor:

**G – Consult** - Ing. Vladimír Gejdoš, Šaľa - HIS

**GeMaDe, s.r.o.** – Ing. Eugen Dedinský, Nižná - ASD

Realizované stavebné objekty:

**SS.01 Žaškov, kanalizácia**

**SS.02 Párnica, kanalizácia**

**SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač**

**SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač**

Dňa **09.11.2021** bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru a Zmluvu o poskytnutí služieb asistenta stavebného dozoru.

Dňa **07.12.2021** bola podpísaná **zmluva** so zhotoviteľom stavby **na výkon stavebných prác a dňa 08.12.2021 nadobudla Zmluva o Dielo účinnosť.**

Stavebný dozor v zmysle čl. 8.1. Všeobecných zmluvných podmienok vyhlásil začiatok stavebných prác na Dielo „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ na **21.12.2021.**

Dňa **22.02.2022** OVS, a.s. - Objednávateľ stavebných prác, oficiálne odovzdal Stavenisko Zhotoviteľovi – združeniu „ORAVA VSCVH“.


Dňa **11.11.2022** bol uzatvorený **Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo**, premetom ktorého bolo navýšenie jednotkových cien materiálov v dôsledku nepriaznivej situácie na svetovom trhu. Účinnosť nadobudol dňa 15.11.2022.

Navýšenie ZoD nastalo z pôvodnej zmluvnej ceny 14 865 800,88 € na 16 077 130,32 €, teda o **1 211 329,44 € bez DPH** čo predstavuje navýšenie o **8,14%**.


## Práce na projekte v sledovanom období:

**SS.01 Žaškov, kanalizácia**

V sledovanom období bolo položených 1 343,91 m kanalizačného potrubia. Pracovalo sa na kanalizačných vetvách B8-2, C1-1, B3, B4, B13, B7-1, B7, C3, C1-2. Budovaných bolo 35 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 192,76 m.

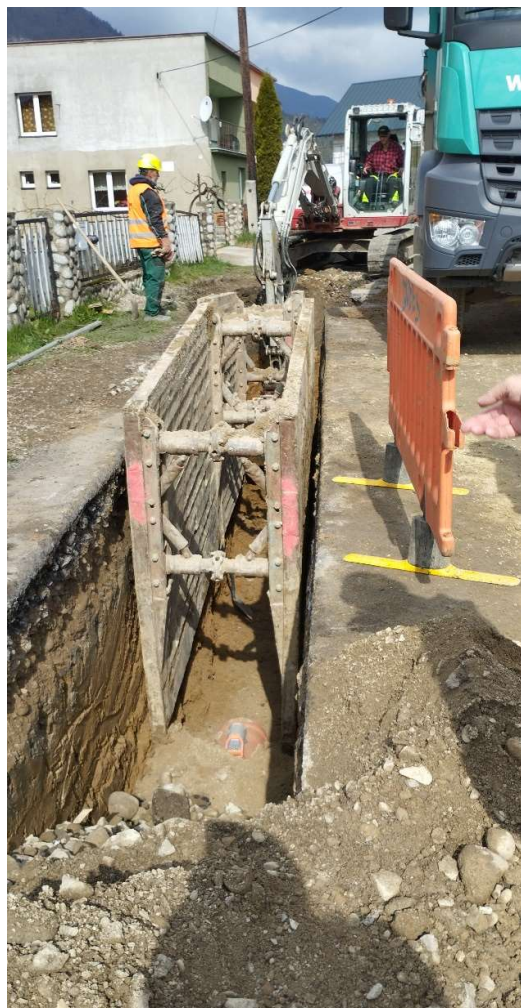

**Obr. 1: Budovanie kanalizácie - stavebné práce v miestnej komunikácii v obci Žaškov (SS.01)**

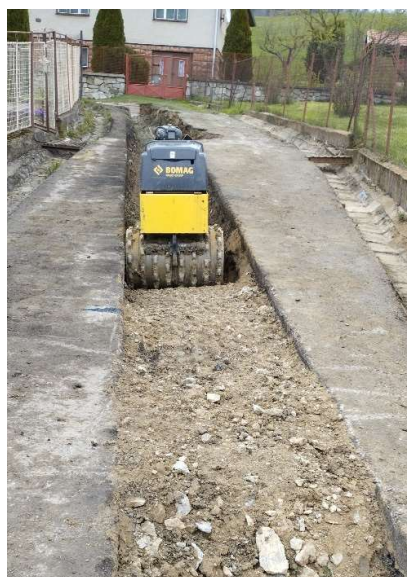

**Obr. 2: Vibračné zhutňovanie zemin - spätný zásyp v obci Žaškov (SS.01)**

K dátumu 30.04.2023 je položených 8 148,94 m kanalizačného potrubia z celkových 10 746 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **77,79%** kanalizačného potrubia v obci Žaškov. Začiatkom sledovaného obdobia sa na stavebnom súbore nepracovalo v dôsledku nepriaznivého počasia. V dôsledku zimného obdobia a konsolidácie ryhy vo väčšej miere, bolo potrebné komunikácie neustále sledovať a unížené úseky vhodne dosýpať.

### **SS.02 Párnica, kanalizácia**

V sledovanom období bolo položených 434,88 m kanalizačného potrubia. Budované boli vetvy: B1, C, C3, B1-1. Vybudovaných bolo 36 ks kanalizačných prípojok k rodinným domom, čo predstavuje 288,02m.

Na začiatku sledovaného obdobia bolo v dôsledku nepriaznivého počasia potrebné vo zvýšenej miere udržiavať najmä miestne komunikácie.



**Obr. 3 Budovanie verejnej kanalizácie v obci Párnica (SS.02)**



**Obr.4: Osádzanie čerpacej stanice - ČS.08 v obci Párnica (SS.02)**

V závere sledovaného obdobia je položených 5 511,16m kanalizačného potrubia z celkových 7 757,5 m (uvažované bez kanalizačných prípojok), čo predstavuje **71,04%** kanalizačného potrubia v obci Párnica.

V sledovanom období boli osadené čerpace stanice ČS.04, ČS.07 a ČS.08 - stavebná časť (predpokladaný termín dodávky technologickej časti je v mesiacoch jún, júl).

V závere sledovaného obdobia sa realizujú prípravné práce pre budovanie výtlačného potrubia V1 popod rieku Orava. Princíp spočíva v riadenom vŕtaní pilotného vrtu, rozšírení vrtu a následnom zatiahnutí chráničky.

#### **SS.05 Žaškov – Oravská Poruba, kanalizačný zberač**

V sledovanom období na stavebnom súbore SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač neprebíhali. V súčasnosti je položených 3 690m z celkových 3 719m, čo predstavuje **99,2%**. Zostáva dobudovať 29 m potrubia vrátane osadenia tlmiacich a kalníkových šácht.

#### **SS.07 Oravská Poruba – Dolný Kubín, kanalizačný zberač**

V sledovanom období sa pracovalo na budovaní výtlačného potrubia. Položených je 249,67 m. V závere sledovaného obdobia pracujeme na vydaní povolenia na dočasné vyňatie z lesných pozemkov v zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch.



*Obr. 5: Sťahovanie ornice a výkopové práce pre uloženie výtlačného potrubia „V1“ - PE-HD DN200 (SS.07)*

#### Časť Diela vybudovala OVS, a.s.:

Rozhodnutím MŽP SR zo dňa 21. 03. 2016 bola žiadosť o NFP neschválená. Dôvodom neschválenia bol nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených v rámci výzvy.

Na základe týchto skutočností Oravská vodárenská spoločnosť v roku 2016 rozhodla, že bude práce realizovať z vlastných zdrojov. Výstavba časti diela (**výtlačné potrubie SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač**) začala v **07/2017**. Projekt bol budovaný v zmysle stavebného povolenia a dokumentácie pre stavebné povolenie. Položených bolo 986m výtlačného potrubia. Z uvedeného vyplýva, že v závere sledovaného obdobia je **SS.07 Oravská Poruba-Dolný Kubín, kanalizačný zberač** vybudovaný na **68,39%** projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia.

#### Prestavanosť jednotlivých stavebných objektov Diela k 04/2023:

- **SS.01 Žaškov, kanalizácia - 77,79% (gravitačné potrubie)**
- **SS.02 Párnica, kanalizácia - 71,04% (gravitačné + výtlačné potrubie)**
- **SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2% (výtlačné potrubie)**
- **SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 88,51% z celkovej projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia (v rátane už vybudovanej časti - investícia OVS, a.s.: 2017-2019) (gravitačné + výtlačné potrubie)**



**Obr. 6: Obhliadka staveniska pracovníkom OVS, a.s. v rámci zabezpečenia BOZP (SS.01 a SS.02)**

V súčasnosti je položených **22,21 km** z celkových **30,003 km**. V závere sledovaného obdobia je vybudovaných **74,35%** dĺžky kanalizačného potrubia na diele „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“.

V Dolnom Kubíne, dňa 05.05.2023
