

Projekt:

„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie a z vlastných zdrojov prijímateľa Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

Štvrťročná správa č. 01 za obdobie 09/2013 – 11/2013

Základné údaje o projekte:

Prioritná os:

1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

Operačný cieľ:

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Riadiaci orgán:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Prijímateľ pomoci:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Projekt nadväzuje na I. etapu projektu, ktorá bola ukončená 31. 08. 2009. Dňa 26. 08. 2010 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok a dňa 14. 11. 2012 Európska komisia schválila veľký projekt odkanalizovania regiónu Oravy „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“ Ide o projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP) pod Ministerstvom životného prostredia.

Realizáciou projektu bude na novú kanalizačnú sieť napojených **18 801** obyvateľov zo 7 obcí **Vavrečka, Hruštín, Zákamenné, Novoť, Rabča, Oravská Polhora a Sihelné.**

Odpadové vody od týchto producentov budú čistené na už vybudovanej ČOV Námestovo, ktorá bola vybudovaná v rámci prvej etapy projektu aj pre producentov etapy II. a ostatných obcí okresu Námestovo.

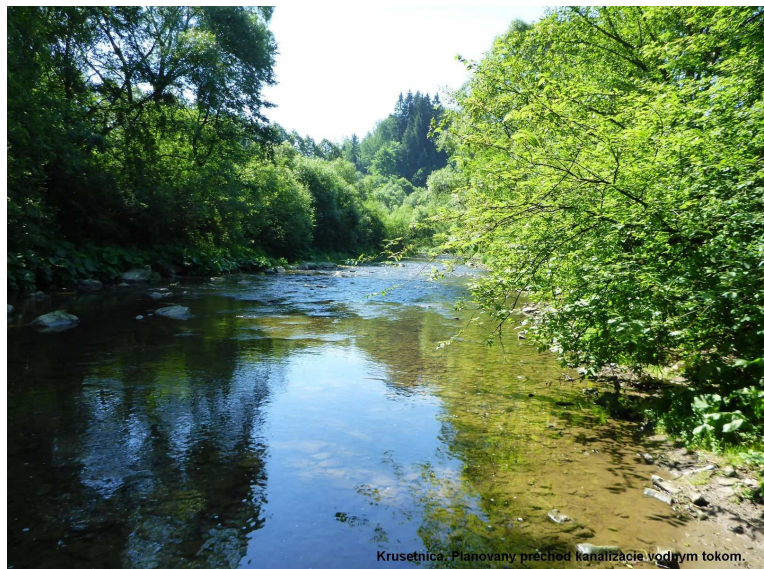

Krusetnica. Planovaný prechod kanalizácie vodným tokom.

V rámci projektu sa vybuduje **127,207** km gravitačnej kanalizácie, **15 ks** čerpacích staníc odpadových vôd a **9,093 km** výtlačného kanalizačného potrubia. Zároveň sa zrekonštruujú existujúce čistiarne odpadových vôd v **Dolnom Kubíne** (23 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Dolný

Kubín a príslušných obcí a **ČOV v Nižnej n. Oravou** (26 000 EO) ktorá slúži pre čistenie odpadových vôd mesta Tvrdosín a Trstená a príslušných obcí.

Projekt spĺňa požiadavky smerníc EU 91/271/EEC o komunálnych odpadových vodách vyriešením 5 aglomerácií 2 000 – 10 000 EO, 2 aglomerácií nad 10 000 – 15 000 EO a 1 aglomerácie nad 15 000 – 150 000 EO, riešené aglomerácie sú v súlade s Národným programom SR a s Operačným programom Životné prostredie.

Začiatok výstavby: **09/2013**

Koniec výstavby: **12/2015**

Celkové investičné výdavky projektu:

50 690 860,34 €

Celkové oprávnené výdavky:

41 270 876,10 €

Príspevok poskytovateľa EÚ a SR:

36 941 561,20 €

Vlastné zdroje prijímateľa:

6 490 813,90 €

Zhotoviteľ stavby:

OHL ŽS, a.s., Burešová 938/17, 660
02 Vevěří, Česká republika,
OHL ŽS SK, a.s., Furmanská 6, 841
03 Bratislava, SR,
MBM-GROUP, a.s., Hviezdoslavovo
námestie 213, 029 01 Námestovo,
SR



Stavebné práce v statnej ceste v obci Zakamenne 12. 11. 2013

Stavebný dozor:

Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, Česká republika
ESP Consult, s.r.o., Bratislavská cesta 100/D, 931 01 Šamorín,

Proces verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác:

Dňa 15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie. Dňa 16. 08. 2012 sa uskutočnilo otváranie ponúk. Nasledoval proces verejného obstarávania. Listom MŽP SR č. 3061/2013-5.5, 44721/2013 z 28. 08. 2013 bol vydaný pokyn na podpis zmluvy a zároveň bola vykonaná administratívna kontrola VO do štádia pred podpisom zmluvy. Dňa 20. 09. 2013 prijímateľ predložil na MŽP SR podpísanú zmluvu na stavebné práce na administratívnu kontrolu vrátane príloh k zmluve. Listom MŽP SR č. 3061/2013-5.5, 48873/2013 z 24. 09. 2013 bol odsúhlasený proces VO, zmluva o dielo a bol vydaný záver z administratívnej kontroly, že je možné pristúpiť k financovaniu.

Služby stavebného dozoru:

Dňa 15. 05. 2012 bolo vo vestníku ÚVO zverejnené oznámenie. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk je z dňa 1. 10. 2012, odoslanie informácie o výsledku z 05. 10. 2012. Dňa 20. 09. 2013 prijímateľ predložil

na MŽP SR podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb na administratívnu kontrolu vrátane príloh k zmluve. Listom MŽP SR č.3061/2013-5.5, 48868/2013 z 24. 09. 2013 bol odsúhlasený proces VO, zmluva na služby a bol vydaný záver z administratívnej kontroly, že je možné pristúpiť k financovaniu.

Propagácia a publicita projektu:

Na MŽP SR bol dňa 22. 03. 2013 odovzdaný na administratívnu kontrolu návrh súťažných podkladov na „propagáciu a publicitu“. Dňa 04. 09. 2013 prijímateľ predložil na MŽP SR konečnú verziu súťažných podkladov na propagáciu a publicitu na administratívnu kontrolu. MŽP SR listom č. 3061/2013-5.5, 47384/2013 z 16. 09. 2013 odsúhlasilo súťažné podklady a vyzvalo na proces VO. OVS, a.s. zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku č. 188/2013 dňa 26. 09. 2013 (15933-WYS). Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku Verejného obstarávania č. 188/2013 z 26. 09. 2013 pod č. 15933-WYS. Otváranie obálok bolo dňa 23. 10. 2013. Dňa 31. 01. 2014 bola podpísaná zmluva o dielo.

Stav prác na projekte:

Administratívny pokyn (dátum začatia plnenia zmluvy) bol vydaný dňa 12. 09. 2013. Dňa 24. 09. 2011 je oficiálny termín začatia prác a služieb stavebného dozoru. Od 21. 10. 2013 sa vykonávalo rezanie asfaltu a pretláčanie popod štátnu komunikáciu. Fyzické práce (samotné výkopy ryhy a pokládka kanalizačného potrubia sa začali od 06. 11. 2013).

